

Український фонд соціальних інвестицій

**ПРОЄКТ: EU4Skills: Модернізація інфраструктури системи
професійно-технічної освіти в Україні**



ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО ВПЛИВУ

**за субпроектом № 22-05-3 «Вінницьке міжрегіональне
вище професійне училище, м. Вінниця, Вінницька обл./
EU4Skills»**

редакція № 1 від 24.12.2021

Затверджено Виконавчим комітетом УФСІ (протокол № 2 від 21.01.2022)

редакція № 2 від 14.02.2022

Погоджено з KfW (лист від 17.02.2022)

Київ-2021

	Перелік скорочень.....	3
	Вступ.....	4
1	ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЄКТ.....	4
2	ОПИС ОБ’ЄКТА ТА ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.....	4
	Стислі фізико-географічні та кліматичні характеристики	
2.1	місцевості.....	4
2.2	Опис об’єкта.....	6
2.3	Опис планованої діяльності.....	7
3	ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ УКРАЇНИ, СТАНДАРТІВ, ПОЛІТИК, ПРАВИЛ І ПОЛОЖЕНЬ У СФЕРІ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ.....	8
3.1	Опис застосовних нормативно-правових актів та вимог України..	10
3.2	Опис застосовних міжнародних стандартів та вимог.....	12
4	ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО ВПЛИВУ..	14
5	ПЛАН ЕКОЛОГІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ.....	26
6	ВЗАЄМОДІЯ ІЗ ЗАЦІКАВЛЕНИМИ СТОРОНАМИ, ОПРИЛЮДНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ОПРАЦЮВАННЯ СКАРГ ТА ЗВЕРНЕНЬ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН.....	41
	Додаток 1 Критерії скринінгу Субпроекту. Перелік контрольних питань для заповнення і збереження.....	48
	Додаток 2 Протокол громадський консультацій	53

Перелік скорочень

KfW	Німецький банк розвитку KfW
ДПТНЗ	Державний професійно-технічний навчальний заклад
МОН	Міністерство освіти і науки України
МРС	Механізм розгляду скарг
ОВНС	Оцінка впливу на навколишнє середовище
ОДА	Обласна державна адміністрація
ОЕСВ	Оцінка екологічного та соціального впливу
ПВЗС	План взаємодії із зацікавленими сторонами
ПЕСМ	План екологічного та соціального менеджменту
ПКД	Проектно-кошторисна документація
ПТО	Професійно-технічна освіта
РП УФСІ	Регіональне представництво Українського фонду соціальних інвестицій
СЕС	Соціально-екологічні стандарти Світового банку
СП	Субпроект
УФСІ	Український фонд соціальних інвестицій
ЦО УФСІ	Центральний офіс Українського фонду соціальних інвестицій

Вступ

Оцінка екологічного та соціального впливу (далі - ОЕСВ) була проведена з метою виявлення та оцінки потенційних екологічних та соціальних впливів та розробки відповідних заходів пом'якшення, які задокументовані у Плані екологічного та соціального менеджменту (далі - ПЕСМ).

ОЕСВ розроблено відповідно до положень соціально-екологічних стандартів Світового банку (далі - СЕС Світового банку), Загального керівництва з охорони навколишнього середовища, здоров'я та праці Міжнародної фінансової корпорації та з урахуванням вимог національного екологічного законодавства, фактичного стану природного та соціального середовища робочого місця та технічний стан об'єкта.

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЄКТ

Уряд України та Комісія Європейських Співтовариств уклали угоду від 17 грудня 2018 року щодо фінансування заходів «EU4Skills: Кращі навички для сучасної України», які частково фінансуватимуться через Німецький Банк розвитку KfW (далі - KfW). На основі цієї Угоди, а також на основі Угоди про внесок від 2 жовтня 2019 року між Європейським Союзом в особі Європейської комісії ("Європейська комісія") та KfW (далі - Угода про внесок) підписано Фінансову та проектну угоду про грант № ENI/2019/410-215 від 30.07.2020 року (далі – Угода про грант) між KfW та Українським фондом соціальних інвестицій (УФСІ) на впровадження Проєкту «EU4Skills: Модернізація інфраструктури системи професійно-технічної освіти в Україні» (далі – Проєкт). Даний Проєкт стосується модернізації системи професійно-технічної освіти і навчання (ПТО) в Україні. Він спрямовуватиметься на реконструкцію та модернізацію закладів ПТО та закупівлі обладнання.

Метою Проєкту є створення сучасної інфраструктури професійної (професійно-технічної) освіти, що сприяє підвищенню привабливості серед учнів здобуття освіти у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та створює основу для ефективної освіти, що орієнтована на отримання навичок у професіях, які затребувані на українському ринку праці.

Опис Проєкту: 15 визначених закладів професійної (професійно-технічної) освіти отримають інвестиції у формі здійснення енергоефективної реконструкції освітніх приміщень та забезпечення необхідним для освітнього процесу обладнанням.

Географічний регіон Проєкту: Вінницька, Запорізька, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Чернівецька області.

2. ОПИС ОБ'ЄКТА ТА ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1 Стислі фізико-географічні та кліматичні характеристики місцевості

Місто Вінниця – місто на південному заході України, адміністративний центр Вінницької області. Площа території міста – 113,2 км². Чисельність населення станом на 01.01.2021 – 370264 особи. Річна кількість опадів 638 мм. Середня температура повітря у липні складає 18,3 °С, у січні -5,8 °С. З несприятливих кліматичних явищ спостерігаються хуртовини (від 6 до 20 днів на рік), тумани в холодний період року (від 37 до 60 днів), грози з градом (3-7 днів).


Ділянка місця проведення робіт знаходиться в північній частині м. Вінниця, по вул. Стрілецька, 5.

Рельєф місцевості розташування проектного будівництва – рівний, спланований.

Не сприятливі фізико-геологічні процеси та явища в межах ділянки не спостерігаються. В районі місця проведення робіт відсутні заповідні об'єкти.

Транспортна схема існуючих доріг дозволяє проїзд будівельної техніки на майданчик по вул. Стрілецькій, що має асфальтобетонне покриття.

Рис. 1 Розташування місця проведення робіт на мапі

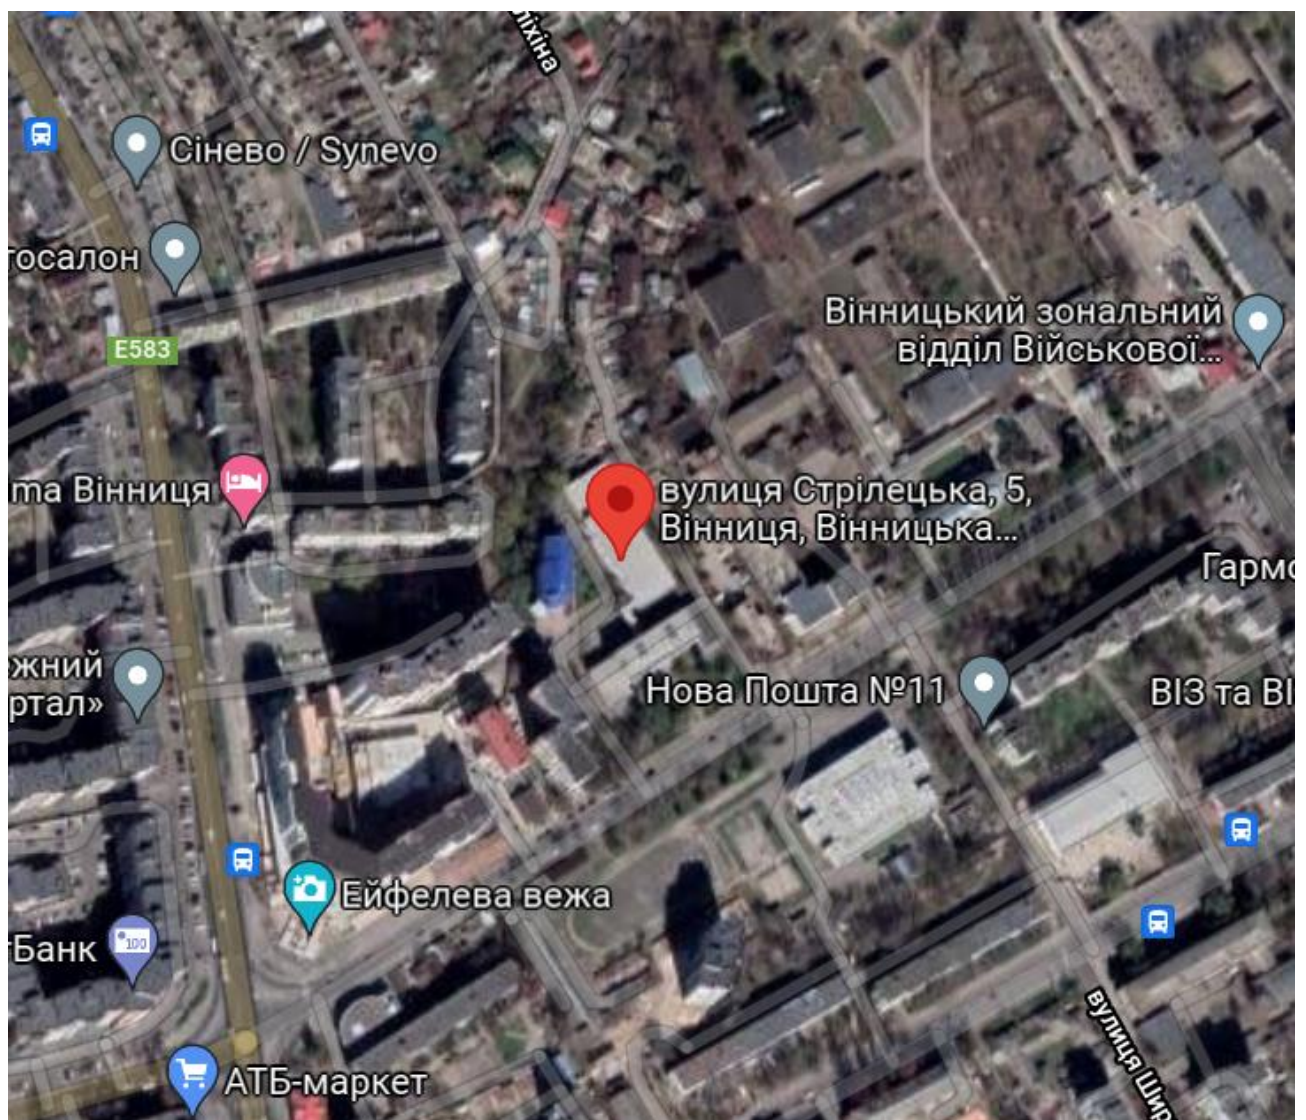

Ділянка місця проведення робіт межує:
з півночі – гаражі, житлові будинки;
зі сходу – недобудована споруда, комерційна забудова;
з заходу – територія Вінницького обласного центру зайнятості, житлові будинки, гуртожиток ДПТНЗ;
з півдня – адміністративний корпус ДПТНЗ, проїзна частина вул. Стрілецької, території середньоосвітнього навчального закладу (школа-гімназія № 6).

2.2 Опис об'єкта

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище» (надалі- Вінницьке МВПУ, Реципієнт, ДПТНЗ) є державним професійно-технічним навчальним закладом, що провадить підготовку кваліфікованих робітників із десяти професій, фахових молодших бакалаврів за однією спеціальністю, а також перепідготовку незайнятого населення, профільне та допрофільне навчання школярів.

Наразі кількість учнів складає 812 осіб. Чисельність персоналу закладу дорівнює 142 особи, у тому числі 93 особи - педагогічні працівники.

Заклад готує кваліфіковані кадри за наступними професіями: «Кухар. Кондитер», «Агент з постачання. Продавець продовольчих товарів», «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення. Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних», «Оператор комп'ютерного набору. Оператор комп'ютерної верстки», «Оператор комп'ютерного набору. Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин», «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення», «Монтажник інформаційно-комунікаційного устаткування», «Адміністратор», «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення. Фотограф (фотороботи)», «Агент з постачання».

Заклад має ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти затверджену наказом МОН України від 02.02.2018 р № 113- л, та ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти затверджену наказом МОН України від 25.09.2019 № 960-л.

Земельна ділянка площею 0,7744 га є державною власністю та належить ДПТНЗ на праві постійного користування на підставі державного акту на право постійного користування земельною ділянкою серія ЯЯ № 018438 від 11.09.2009 (цільове призначення: для громадського призначення).

Комплекс будівель закладу належить державі в особі МОН. Відповідно до наказу МОН від 12.12.2018 № 1387 комплекс будівель передано в оперативне управління ДПТНЗ.

Перед початком проведення будівельних робіт Замовник будівельних робіт (ДПТНЗ) отримає дозвіл на початок виконання будівельних робіт в органі архітектурно-будівельного контролю України.

Після завершення виконання будівельних робіт Замовник будівельних робіт (ДПТНЗ) підготує пакет документів для подання та отримання сертифікату про прийняття об'єкта в експлуатацію.

Характеристика об'єкта: існуюча будівля навчально-виробничих майстерень двоповерхова, в плані має прямокутну форму. Будівля побудована у 1978 році. Загальна площа навчальних майстерень та допоміжних приміщень двох поверхів – 2661,1м²; площа, яка передбачається до ремонту – 467,3 м².

Конструктивна частина будівлі – з несучим каркасом із збірних залізобетонних конструкцій та несучими зовнішніми стінами.

Стіни – цегляні, перегородки – цегляні; покриття – суміщене, плоске, утеплене, із покрівлею з руберойду по утеплювачу та збірним залізобетонним плитам покриття; підлоги – із керамічної плитки, лінолеум, вікна – металопластикові, дерев'яні; двері – дерев'яні; внутрішнє опорядження стін – олійне фарбування та фарбами на водній основі по цементно-вапняній штукатурці; зовнішнє опорядження – цегляна кладка під розшивку. Внутрішні мережі: опалення – виконані із сталевих водопровідних труб та чавунних радіаторів; електроживлення – виконано проводами та кабелями із алюмінієвими жилами; каналізація – із чавунних труб.

Інженерні мережі: опалення, системи водопостачання та водовідведення – централізовані.

Стан основних конструктивних елементів – задовільний, будівля потребує модернізації.

Рослинність прибудинкової території: трава, кущі, дерева.

Обстеження об'єкту на наявність АБМ.

25 серпня 2021 року в Вінницькому МВПУ було візуально обстежено усі приміщення та конструкції, що плануються до ремонту, на наявність АБМ: комп'ютерна лабораторія 217, 219, кабінети старших майстрів, кімнати майстрів, майстерня електрозв'язку, майстерня з обслуговування обчислювальної та офісної техніки 115, 117А, кухня-лабораторія, коридори тощо.

Під час обстеження матеріали, що мають ознаки наявності азбестових волокон, не виявлено, зразки не відбирались.

Всі ділянки будівлі були доступні для обстеження. Можливих місць локалізації прихованих АБМ немає.

2.3 Опис планованої діяльності

У рамках реалізації субпроекту (далі - СП) попередньо передбачено:

1) виконання будівельних робіт з ремонту частини приміщень двоповерхової будівлі майстерень (літера В за технічним паспортом), що розташована за адресою: м. Вінниця, вул. Стрілецька, 5:

- Ремонт даху будівлі Виробничі майстерні з влаштуванням шатрової покрівлі площею 1500 м²;
- Утеплення фасаду будівлі площею 440 м²;
- Заміна вікон з влаштуванням відкосів площею 165 м²;

- Ремонт коридору 1-го поверху з заміною покриття підлоги площею 150 м²;
 - Ремонт виробничої майстерні 112 виробнича майстерня за професією «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення» площею 106 м²;
 - Ремонт виробничої майстерні 113 виробнича майстерня за професією «Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно обчислювальних машин» площею 106 м²;
 - Ремонт виробничої майстерні 117 виробнича майстерня за професією «Радіоелектроніка та радіовимірювання» площею 54 м²;
 - Ремонт туалетних кімнат на 1 поверсі площею 45 м²;
 - Влаштування пожежної сигналізації - 2670 м²;
 - Модернізація серверної кімнати.
- 2) облаштування обладнанням навчальних майстерень за професіями:
- 112 виробнича майстерня за професією «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення»;
 - 113 виробнича майстерня за професією «Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно обчислювальних машин»;
 - 117 виробнича майстерня за професією «Радіоелектроніка та радіовимірювання».

3. ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ УКРАЇНИ, СТАНДАРТІВ, ПОЛІТИК, ПРАВИЛ І ПОЛОЖЕНЬ У СФЕРІ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ.

1. Кодекс законів про працю
2. Земельний кодекс
3. Господарський кодекс
4. Кодекс цивільного захисту
5. Лісовий кодекс
6. Водний кодекс
7. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»
8. Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» (не застосовується, оскільки об'єкт будівництва не належить до видів планованої діяльності, що має значний вплив на довкілля)
9. Закон України «Про охорону атмосферного повітря»
10. Закон України «Про відходи»
11. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізму правового регулювання та посилення відповідальності у сфері поводження з відходами»
12. Закон України «Про металобрухт»
13. Закон України «Про основи містобудування»
14. Закон України «Про охорону земель»
15. Закон України «Про землеустрій»
16. Закон України «Про архітектурну діяльність»
17. Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»

18. Закон України «Про охорону праці»
19. Закон України «Про звернення громадян»
20. Закон України «Про інформацію»
21. Закон України «Про доступ до публічної інформації»
22. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення»
23. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
24. Закон України «Про благоустрій населених пунктів»
25. Закон України «Про природно-заповідний фонд України»
26. Закон України «Про рослинний світ»
27. Закон України «Про тваринний світ»
28. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики»
29. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 № 1106 «Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони»
30. Наказ Мінсоцполітики від 23.06.2017 № 1050 «Про затвердження Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках»
31. Наказ Мінсоцполітики від 29.11.2018 № 1804 «Про затвердження Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці»
32. ДБН А 2.2.-3-2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво
33. ДБН А.2.2-1-2003 Про проведення оцінки впливу на навколишнє середовище
34. ДБН А.3.1 – 5:2016 Організація будівельного виробництва
35. ДБН В. 1.1-7:2016 Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги
36. ДСТУ 8855:2019 Будівлі та споруди. Визначення класу наслідків (відповідальності)
37. ДБН А.3.2-2-2009. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення
38. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 01.10.2012 № 762 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Про безпеку і захист працівників від шкідливого впливу азбесту і азбестовмісних матеріалів».
39. ДБН В.2.4-2-2005 Проектування. Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування.
40. Керівництво з оцінки та управління екологічними, соціальними та кліматичними аспектами від 01.02.2021 року
41. Соціально-екологічні стандарти Світового банку від 01.10.2018 року
42. Загальне і галузеве керівництво з охорони навколишнього середовища, здоров'я та праці
43. Фундаментальні конвенції Міжнародної організації праці (МОП)

<https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm#:~:text=The%20ILO%20Governing%20Body%20has,forced%20or%20compulsory%20labour%3B%20the>

44. Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля
45. Директива Ради 92/57/ЄЕС Про мінімальні вимоги щодо безпеки і захисту здоров'я на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках
46. Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті
47. Об'єднана конвенція про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами

3.1 Опис застосовних нормативно-правових актів та вимог України

Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначено правові, економічні та соціальні основи організації охорони навколишнього природного середовища.

Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23 травня 2017 р. встановлює правові та організаційні засади оцінки впливу на довкілля та забезпечує виконання Україною міжнародних зобов'язань у рамках Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті та Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості у процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються навколишнього середовища. Частинами 2 та 3 ст. 3 цього Закону визначено перелік видів діяльності, які потребують ОЕВ/ОВД.

Основним законом, який регулює будівельну діяльність є Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності». Цей закон визначає, які документи повинні бути підготовлені для будівельних проєктів різних типів, і яким чином така документація повинна час від часу переглядатися.

Порядок підготовки документації, яка стосується оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС), встановлюється Державними будівельними нормами ДБН А.2.2-1-2003 «Про проведення оцінки впливу на навколишнє середовище».

Об'єкт будівництва не входять до видів планованої діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля, і не підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Але ДБН А.2.2-3-2014 вимагає розроблення матеріалів ОВНС, включаючи дані щодо всіх очікуваних впливів на довкілля (земельні, водні та інші ресурси), їх мінімізації та компенсації для проєктування всіх об'єктів невинного призначення. ДБН А.3.1-5:2016 включає набір вимог до питань екологічних та соціальних аспектів на місці (проєкт організації будівництва) у проєктно-кошторисну документацію, а також встановлені вимоги до проєкту виконання робіт підрядником (документ з тією ж метою і подібний до ПЕСМ Підрядника).

ДБН А.3.2-2:2009 визначає вимоги до охорони праці на будівельних майданчиках.

Законодавство України з питань охорони праці складається з Закону України «Про охорону праці», Кодексу законів про працю, Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.

Державна політика в галузі охорони праці базується на принципі пріоритету життя і здоров'я працівників, повної відповідальності роботодавця за створення належних, безпечних і здорових умов праці.

Зокрема, положеннями Закону України «Про охорону праці» визначено права працівників на охорону праці під час роботи (ст. 6), на пільги та компенсації за важкі та шкідливі умови праці (ст. 7), забезпечення працівників спецодягом, іншими засобами індивідуального захисту, мийними та знешкоджувальними засобами (ст. 8), обов'язкове проходження навчання з питань охорони праці працівників (ст. 18). Задля забезпечення дотримання наведених положень роботодавець організовує процес управління охороною праці, у тому числі, але не виключно, шляхом розроблення та затвердження положень, інструкцій, інших актів з охорони праці, створення служби з охорони праці та призначення відповідальних осіб за вирішення конкретних питань охорони праці, здійснення контролю за додержанням працівником технологічних процесів, правил поведінки з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, використанням засобів колективного та індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до вимог з охорони праці.

Відповідно до ст. 19 роботодавець здійснює фінансування заходів з охорони праці.

Наказом Міністерства соціальної політики України від 29.11.2018 № 1804 затверджено Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці, якими встановлено загальні вимоги до засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ), що використовуються працівниками під час трудового процесу.

Наказом Міністерства соціальної політики України від 29.01.1998 № 9 затверджено Положення про розроблення інструкцій з охорони праці, яким встановлено вимоги до змісту, побудови і викладення інструкцій з охорони праці, що діють в межах підприємства, установи, організації.

Наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 затверджено Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, яким встановлено порядок навчання та перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників у процесі трудової діяльності, а також учнів, курсантів, слухачів та студентів навчальних закладів під час трудового і професійного навчання.

Наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 25.01.2012 № 67 затверджено Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників, якими встановлено вимоги щодо створення безпечних і

нешкідливих умов праці шляхом належного облаштування робочих місць і виробничих, санітарно-побутових та інших приміщень на підприємстві, в установі, організації, безпечного використання працівниками засобів праці, забезпечення навчання працівників і залучення їх до вирішення питань охорони праці, регулювання взаємовідносин з охорони праці між підприємствами у випадку залучення до виконання робіт працівників інших підприємств.

ДБН А.3.2-2-2009. Охорона праці і промислова безпека у будівництві вимоги з охорони праці та промислової безпеки під час виконання будівельно-монтажних робіт. Ці норми поширюються на загальнобудівельні і спеціальні будівельні роботи під час нового будівництва, розширення, реконструкції, технічного переоснащення, капітального ремонту, реставрації будівель та споруд. Загалом сфера управління охороною праці регулюється багатьма нормативно-правовими актами: правилами, нормами, регламентами, положеннями, стандартами, інструкціями тощо.

3.2 Опис застосовних міжнародних стандартів та вимог

Керівництво з оцінки та управління екологічними, соціальними та кліматичними аспектами від 01.02.2021 року описує принципи та процедури оцінки екологічних, соціальних та кліматичних аспектів під час підготовки та впровадження проєктів, що фінансуються KfW, визначає загальну обов'язкову основу для використання екологічних, соціальних та кліматичних стандартів при плануванні, оцінці, впровадженні та здійсненні моніторингу FC-заходів, підвищує прозорість, передбачуваність та підзвітність в процесах прийняття рішень при проведенні комплексної внутрішньої експертизи екологічних та соціальних аспектів та оцінки кліматичних аспектів.

Починаючи з 1 жовтня 2018 року, соціально-екологічні принципи Світового банку (далі - СЕП) поширюються на всі нові інвестиційні проєкти, що фінансуються Світовим банком.

СЕП дозволяють Світовому банку і Позичальникам підвищувати якість управління соціально-екологічними ризиками проєктів і покращувати результати розвитку.

СЕП включають в себе:

Концепцію сталого розвитку;

Соціально-екологічну політику Світового банку в області інвестиційно-проєктного фінансування;

Соціально-екологічні стандарти;

Директиву Банку: Екологічна та соціальна директива щодо фінансування інвестиційних проєктів;

Директиву Банку щодо подолання ризиків та наслідків для знедолених або вразливих осіб або груп осіб.

Перелік соціально-екологічних стандартів Світового банку (далі - СЕС):

СЕС 1: Оцінка і управління соціально-екологічними ризиками і впливами;

СЕС 2: Робочий персонал і умови праці;

СЕС 3: Ефективне використання ресурсів та запобігання забрудненню довкілля;

СЕС 4: Охорона здоров'я та забезпечення безпеки громад;

СЕС 5: Відчуження земель, обмеження права землекористування і примусове переселення;
СЕС 6: Збереження біорізноманіття та збалансоване управління живими природними ресурсами;
СЕС 7: Корінні народи / історично незахищені традиційні місцеві громади країн Африки на південь від Сахари;
СЕС 8: Культурна спадщина;
СЕС 9: Фінансові посередники;
СЕС 10: Взаємодія із зацікавленими сторонами і розкриття інформації.
Загальне і галузеве керівництво з охорони навколишнього середовища, здоров'я та праці.

Беручи до уваги особливості СП та потенційні соціально-екологічні наслідки від його реалізації, протягом реалізації СП застосовуються наступні СЕС:

- СЕС 1: Оцінка і управління соціально-екологічними ризиками і впливами застосовується для оцінки, управління і моніторингу соціально-екологічними ризиками і впливами на кожній стадії СП.
- СЕС 2: Робочий персонал і умови праці застосовується з метою управління питаннями охорони та безпеки праці, а також створення безпечних та здорових умов праці протягом реалізації СП.
- СЕС 3: Ефективне використання ресурсів та запобігання забрудненню довкілля застосовується з метою управління відходами, у тому числі небезпечними, регулювання питання забруднення навколишнього середовища: повітря, ґрунту, води .
- СЕС 4: Охорона здоров'я та забезпечення безпеки громад застосовується для забезпечення охорони здоров'я та безпеки постраждалих громад протягом життєвого циклу СП, включаючи тих, які через свої конкретні обставини можуть бути вразливими, безпеки руху громадян та дорожнього руху під час виконання будівельних робіт, управління небезпечними матеріалами під час виконання будівельних робіт (включаючи поводження з азбестовмісними відходами).
- СЕС 10: Взаємодія із зацікавленими сторонами та розкриття інформації застосовується для забезпечення систематичного підходу до взаємодії із зацікавленими сторонами, підтримання конструктивних відносин із зацікавленими сторонами, забезпечення врахування думок зацікавлених сторін, розкриття відповідної проектної інформації та забезпечення прозорого, зрозумілого та доступного механізму реагування на скарги та звернення.

Перелік СЕС, які не застосовуватимуться протягом реалізації Проєкту:

- СЕС 5 Відчуження земель, обмеження права землекористування і примусове переселення не застосовується, оскільки СП не передбачає відчуження земель, обмеження права землекористування і примусового переселення.
- СЕС 6: Збереження біорізноманіття та збалансоване управління живими природними ресурсами не застосовується, оскільки в рамках СП не виявлено впливів на біорізноманіття та стале управління живими природними ресурсами, а також, збереження основних екологічних функцій місць проживання,

включаючи ліси і біорізноманіття, яке ними підтримується, на управління первинним відтворенням і заготівлею живих природних ресурсів.

– СЕС 7: Корінні народи / історично незахищені традиційні місцеві громади країн Африки на південь від Сахари не застосовується, оскільки в зоні реалізації СП не присутні корінні народи, описані у даному СЕС.

– СЕС 8: Культурна спадщина не застосовується, оскільки діяльність в рамках СП не впливає на культурну спадщину (матеріальну та нематеріальну спадщину), не передбачає реконструкцію будівель культурної/історичної спадщини (або будівель, які розміщені в охоронній зоні об'єктів культурної/історичної спадщини).

– СЕС 9: Фінансові посередники не застосовується, оскільки СП не передбачає залучення фінансових посередників.

Що стосується менеджменту азбестовмісних матеріалів, головна відмінність СЕС від законодавства України полягає в тому, що вимогами національного законодавства не заборонено використання хризотилу (білого азбесту). Щодо питань поводження з азбестовмісними матеріалами, якщо такі будуть несподівано виявлені під час проведення ремонтних робіт, УФСІ буде дотримуватися вимог, що відповідають СЕС:

1. У СП заборонено використання матеріалів, що містять азбест.
2. Питання поводження з азбестовмісними матеріалами (якщо такі будуть несподівано виявлені під час проведення ремонтних робіт), а також охорони праці, звітування та видалення азбестовмісних матеріалів будуть вирішені відповідно до детальних рекомендацій та методологій, що відповідають вимогам KfW, СЕС та попередньо розроблені для УФСІ в рамках впровадження проєкту УФСІ VI кваліфікованим міжнародним експертом з питань поводження з азбестом.
3. Застосовувати вимоги чинного законодавства України та міжнародних стандартів щодо перевезення та видалення азбестовмісних матеріалів, якщо такі будуть виявлені під час проведення ремонтних робіт.

4. ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО ВПЛИВУ

Для виконання положень СЕС та з метою здійснення оцінки екологічного та соціального впливу 23.02.2021 року було проведено скринінг СП, наведений у Додатку 1.

За результатами проведеного скринінгу виявлено потенційний вплив запланованої діяльності в рамках СП на компоненти навколишнього середовища та соціальну сферу.

Виявлені екологічні та соціальні впливи оцінюються відповідно до положень Керівництва та СЕС за наступними критеріями:

- Місце розташування СП;
- Масштабність;
- Зворотність;
- Часові впливи (тимчасовість або постійність);
- Керованість;

- Характер та ступінь потенційних впливів;
- відповідність вимогам національного законодавства та положенням СЕС та Керівництва.

В рамках оцінки впливу розраховується величина ризику (суттєвість впливу), який визначається за допомогою помноження показників ймовірності виникнення ризику та його наслідки.

Рівень наслідків визначається шляхом вивчення ряду факторів за параметрами: місце розташування, масштабність, керованість, зворотність, часові впливи та відповідність вимогам національного законодавства та стандартів, тощо.

Таблиця 4.1 Рівень наслідків

Категорія наслідків	Рівень	Визначення
Особливо загрозливі	4	Довготривалий вплив, велика масштабність впливу на важливі об'єкти (наприклад, природоохоронні зони, національні парки, тощо), значний час на відновлення (більше 10 років), недотримання вимог законодавства, стандартів, положень тощо
Значні	3	Серйозний екологічний та соціальний вплив з довготривалим або середньої тривалості впливом, середній час на відновлення (від 5 до 10 років), вірогідність недотримання екологічних норм
Помірні	2	Короткотривалий або середньої тривалості вплив, достатньо швидке та повне відновлення (від 1 року до 5 років), вірогідність короткотривалого та мінімального недотримання окремих положень стандартів
Низькі	1	Низький екологічний та соціальний вплив, повне дотримання вимог законодавства, стандартів, тощо, повне відновлення менш ніж за рік без будь-яких інтервенцій

Рівень ймовірності виникнення ризику визначається шляхом оцінки вірогідності виникнення певного ризику.

Таблиця 4.2 Рівень ймовірності

Ймовірність виникнення ризику	Рівень	Визначення	Частота
Практично неминучий	4	Відбуватиметься у звичайних умовах роботи	Дуже часто (тривала висока ймовірність)
Вірогідно	3	Вірогідно відбуватиметься у звичайних умовах роботи	Часто (регулярна ймовірність)

Маловірогідно	2	Маловірогідно, але може зрідка відбуватися у звичайних умовах роботи	Одиничні випадки
Дуже маловірогідно	1	Вкрай маловірогідно відбуватиметься у звичайних умовах роботи, але може виникнути у виключних обставинах	Виключні випадки

Суттєвість впливу (СВ) вираховується помноженням наслідків (Н) на ймовірність (Й):

$$СВ = Н \times Й$$

Таблиця 4.3 Суттєвість впливу

Рівень (Н x Й)	Суттєвість
> 12	Критична
8-12	Висока
4-6	Середня
1-3	Низька

Нижче в таблиці наведено опис потенційних ризиків та впливів СП на стадії підготовки до реалізації, на етапі будівництва так і на етапі експлуатації та розрахунок їх суттєвості.

Таблиця 4.4 Розрахунок суттєвості виявлених потенційних ризиків та впливів

Найменування	Заходи з пом'якшення	Рівень впливу	Ймовірність впливу	Суттєвість впливу
Етап підготовки до реалізації СП				
Нехтування екологічними та соціальними аспектами під час підготовки ПКД	1. У складі проектної документації буде розроблено розділ ОВНС, розділ «Проект організації будівництва», що міститиме рішення щодо організації будівництва в цілому, заходи пожежної безпеки та план з охорони праці. 2. У ПКД забезпечити дотримання вимог щодо врахування потреб маломобільних груп населення. 3. Проведення відбору зразків будівельних матеріалів та конструкцій, проведення їх лабораторного аналізу на вміст та стан азбесту, надання відповідних рекомендацій закладу	3	1	3
Недотримання вимог щодо залучення зацікавлених сторін	1. УФСІ розроблено План взаємодії із зацікавленими сторонами (ПВЗС), що буде оприлюднений з метою виявлення думок зацікавлених сторін. 2. Громадськість буде інформована про всі етапи реалізації СП. 3. Розробка і впровадження механізму розгляду скарг (МРС), оприлюднення його. 4. Проведення опитування зацікавлених сторін. 5. Виявлення та оприлюднення можливих збоїв та їхньої тривалості.	2	2	4
Порушення правил повідомлення відповідних місцевих органів та громадськості та процедури отримання дозволу на будівництво Недотримання національних вимог щодо отримання дозволу	1. Місцеві будівельні інспекції повідомлено про плановану діяльність. 2. Громадськість повідомлена через засоби масової інформації та/або у загальнодоступних місцях (у тому числі на місці робіт) про плановану роботу. 3. Усі передбачені законом дозволи на будівництво отримані	4	1	4
Етап будівництва				

Недотримання вимог охорони та безпеки праці, пожежної безпеки	1. Усі роботи будуть проводитися безпечно та з дотриманням дисципліни, щоб звести до мінімуму вплив на сусідніх мешканців і довкілля. 2. Засоби індивідуального захисту робітників, у тому числі для монтажу та введення в експлуатацію обладнання, відповідають міжнародній практиці. 3. На об'єкті будуть стенди з інформацією про основні правила виконання робіт, охорони праці та техніки безпеки та пожежної безпеки. 4. Керування обладнанням та технікою здійснюватиметься навченим та досвідченим персоналом для зниження ризиків нещасних випадків. 5. Впровадження у практику та дотримання рекомендацій ВООЗ та прийнятих урядом заходів щодо захисту від COVID-19: використання одноразових масок, рукавичок, гігієна рук, провітрювання приміщення, недопущення до робочих місць осіб з ознаками хвороби, дотримання дистанції, за можливості проходження процедури вакцинації тощо. Ведення обліку випадків захворювання на COVID-19 серед працівників, інформування відповідних органів. Підрядником буде призначена відповідальна особа за дотриманням зазначених заходів. 6. Підрядник забезпечує перебування обладнання, інструментів та техніки у належному робочому стані. 7. Підрядник забезпечить проведення інструктажів, навчання та перевірку знань з питань охорони праці та техніки безпеки свого персоналу (у т.ч. щодо надання домедичної підготовки та правил поведінки у разі виникнення аварій). 8. Дотримання вимог з охорони праці відповідно до чинного законодавства та нормативних документів України під час монтажу / введення в експлуатацію обладнання.	3	2	6
--	--	---	---	---

	Пожежна безпека: 9. Призначається особа, відповідальна за протипожежний захист. 10. Будівельний майданчик повинен бути оснащений протипожежним обладнанням, а саме, вогнегасниками та протипожежними щитами з необхідним обладнанням, контейнерами для забезпечення пожежогасіння для зберігання води та гідрантами для систем подачі води.			
Недотримання умов праці	1. Підрядник забезпечить для свого персоналу систему моніторингу часів роботи. 2. Підрядник забезпечить наявність копій трудових договорів/трудоих книжок та паспортів працівників Підрядника на об'єкті. 3. Підрядник повинен розробити та впровадити внутрішню політику та процедуру, щоб гарантувати, що жоден працівник не буде підданий дискримінації або домаганням. 4. Підрядник забезпечить персоналу відповідне проживання та прийнятні санітарно-гігієнічні умови відповідно до вимог IFC/EBRD. 5. Механізм розгляду скарг ля персоналу буде розроблений та представлений відповідно до CEC2.	3	2	6
Забруднення повітря, у т.ч. за рахунок пилоутворення	1. Під час розбирання внутрішніх перегородок вище першого поверху використовуватимуться жолоби для скидання сміття. Сміття від розібраних конструкцій триматиметься в контрольованій зоні і збризкуватиметься водою, щоб зменшити пилоутворення. 2. Пилоутворення буде зменшено під час роботи пневматичними інструментами, шляхом постійного розбризкування води та/або шляхом використання протипилових екранів. 3. Територію навколо об'єкта (тротуари, автошляхи) триматимуться чистою, щоб уникнути пилоутворення.	2	3	6

	4. На об'єкті не допускатиметься будь-яке відкрите горіння. Будівельна техніка не повинна працювати вхолосту.			
Шумове забруднення, вібрація	1. Роботи з високим рівнем шуму будуть виконуватися лише протягом часу, узгодженому в дозволі та Програмі робіт, розробленої Підрядником. 2. В процесі роботи кришки двигунів, генераторів, компресорів та іншого обладнання будуть закриті, а обладнання має встановлюватися якомога подалі від житлової забудови.	2	3	6
Забруднення підземних вод	Стічні води з будівельного майданчика мають бути очищені Підрядником перед викидом у поверхневі водотоки, або водойми. Зберігання, використання та утилізація Підрядником хімічних речовин (таких як олія, фарби, паливно-мастильні матеріали, бетонні розчини тощо) проводяться з метою мінімізації потрапляння їх у стічні води.	2	2	4
Пошкодження рослинного покриву	1. На місці проведення робіт необхідно проводити інвентаризацію місцевих дерев (наприклад, фотофіксація), і будь-яка можливість заподіяння шкоди цим деревам повинна бути передбачена. 2. Усі дерева на будівельному майданчику на прилеглій території будуть позначені в генеральному плані будівництва і під час будівництва слід вживати заходів для їх збереження. 3. У разі вирубки дерев Підрядник діятиме в порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах (постанова Кабінету Міністрів України від 01.07.2006 р. № 1045).	2	1	2
Неналежне поводження з відходами	1. Збір відходів та шляхи і ділянки тимчасового зберігання та утилізації будуть визначені для всіх основних видів відходів, які очікуються від робіт по розбиранню конструкцій і будівництва.	2	2	4

	2. Мінеральні будівельні відходи та відходи від розібраних конструкцій будуть відокремлені від загального сміття, органічних, рідких і хімічних відходів шляхом сортування безпосередньо на місці і зберігання різних відходів у відповідних контейнерах. 3. Будівельні відходи будуть зібрані та утилізовані належним чином ліцензованими організаціями зі збору відходів. 4. Документація щодо проведення утилізації відходів буде вестись для підтвердження належного поводження з відходами.			
Неналежне поводження з небезпечними відходами Несподіване виявлення азбесту	1. Якщо на місці ведення робіт будуть тимчасово зберігатися небезпечні або токсичні матеріали, вони будуть поміщені в безпечні контейнери та чітко позначені як небезпечний матеріал з інформацією про склад, властивості; контейнери з небезпечними матеріалами поміщають у герметичний контейнер для запобігання впливу на навколишнє середовище (пролиття, викиди, тощо). 2. Небезпечні відходи мають бути вивезені та видалені спеціалізованою ліцензованою організацією. 3. Використання АВМ в проєктах УФСІ заборонено. 1. Роботи слід негайно припинити. 2. Доступ на територію повинен бути обмежений. 3. Відповідальні особи будуть проінформовані та вжито необхідних заходів для визначення характеристик матеріалу (чи містить азбест, його тип, стан тощо). 4. Якщо матеріал дійсно містить азбест, то з ним слід поводитися відповідно до встановлених рекомендацій та методологій, розроблених для УФСІ кваліфікованим міжнародним експертом з управління азбестом (The Method Statement).	3	2	6

	5. Будь-яка особа, яка може зазнати впливу, буде попереджена, кожен, хто не носить засоби індивідуального захисту (ЗІЗ), у тому числі засоби захисту органів дихання (ЗІЗ), негайно покине зону ураження та проведе процедуру дезактивації. 6. Поширення азбесту буде зведено до мінімуму.			
Загрози для руху транспорту та пішоходів під час виконання будівельних робіт вздовж території, де розташований будівельний об'єкт	1. Безпечний рух для місцевих мешканців буде організований наступним чином: установка дорожніх знаків, попереджувальних знаків, бар'єрів і об'їздів: об'єкт буде чітко видимим вночі, а громадськість буде попереджена про всі потенційні небезпеки. 2. Буде розроблена схема дорожнього руху, проведено інструктаж персоналу. Будуть забезпечені безпечні переходи для пішоходів в місцях перетину з рухом будівельного транспорту. 3. Під час будівництва буде забезпечений безпечний і безперервний доступ до всіх прилеглих споруд та житлових будинків. 4. Пристосування робочого часу до місцевих схем руху транспортних засобів, тобто уникнення основної транспортної діяльності протягом годин пік.	2	2	4
Порушення комфорту проживання місцевого населення	1. Дотримання встановленого графіку проведення будівельних робіт. За необхідності встановлення шумозахисних екранів поблизу будівельного обладнання. Організація безпечного руху для місцевих мешканців, у т.ч. шляхом встановлення дорожніх знаків, попереджувальних знаків, бар'єрів і об'їздів, встановленням попереджувальних знаків і таблиць, влаштуванням необхідного огороження та перехідних містків, відповідного освітлення в нічну пору доби для того, щоб об'єкт було чітко видно, а громадськість була попереджена про всі потенційні небезпеки.	2	2	4

	2. Заздалегідь попереджати місцевих мешканців та інших зацікавлених сторін про виникнення додаткових незручностей з вказанням чіткого часу на їх усунення.			
Порушення вимог безпеки для місцевого населення	1. Всі будівельні роботи здійснюватимуться у суворій відповідності до проєктних умов та тільки в межах будівельного майданчику. 2. Організація безпечного руху для місцевих мешканців, у т.ч. шляхом встановлення дорожніх знаків, попереджувальних знаків, бар'єрів і об'їздів, встановленням попереджувальних знаків і таблиць, влаштуванням необхідного огороження та перехідних містків, відповідного освітлення в нічну пору доби для того, щоб об'єкт було чітко видно, а громадськість була попереджена про всі потенційні небезпеки. 3. Суворе дотримання вимог техніки безпеки та пожежної безпеки працівниками Підрядника.	3	1	3
Виникнення соціальної напруги через брак інформації щодо проєкту та відсутності загальновідомого та доступного каналу для подання скарг/звернень та виникнення незручностей у провадженні навчального процесу	1. Громадськість буде проінформована про хід впровадження СП на всіх етапах впровадження СП відповідно до вимог ПВЗС. 2. Інформація буде розповсюджуватися, а канали подання скарг / претензій публікуватися через інформаційні дошки для громадськості, інформаційні пункти проєкту та веб - сайти закладу та місцевої влади; додатково, з початком будівництва, на будівельному майданчику буде встановлено скриньку для подання скарг, а інформація буде розміщена в громадських місцях на об'єкті; МРС буде розроблено та впроваджено у тестовому режимі; МРС буде представлено на рівні громад та на рівні УФСІ для отримання зворотного зв'язку від зацікавлених сторін та перегляду МРС; організовано процес запису та реагування на скарги.	3	2	6

	3. З місцевим населенням проводитимуться пояснювальні роботи, проводитимуться інструктажі з техніки безпеки та навчання у разі необхідності. 4. Буде неухильно дотримано встановленого графіка будівництва, гарантуючи, що будівельні роботи будуть виконуватися тільки в межах будівельного майданчика. 5. У разі необхідності призупинення надання комунальних послуг мешканцям, які проживають у безпосередній близькості від будівництва, таку потребу слід узгодити з власником комунальних систем, а громадськість повинна бути проінформована про це принаймні за три дні до такого припинення та терміни відновлення. 6. Керівництво закладу налагодить навчальний процес та адаптує навчальний план з метою уникнення зайвого навантаження у зв'язку із шумом, вібрацією та пилом, непотрібного переміщення учнів та викладачів між навчальними аудиторіями закладу, а також заздалегідь інформуватиме про відповідні зміни викладачів, учнів та відвідувачів; буде проведено навчання для викладачів та учнів та відвідувачів з питань охорони праці.			
Несвоєчасне завершення будівельних робіт та введення об'єкта в експлуатацію	1. Здійснення періодичного контролю термінів будівництва та якості та відповідності будівельних робіт ПКД. 2. Моніторинг стану виконання заходів з пом'якшення екологічного та соціального впливу. 3. Взаємодія із зацікавленими сторонами на всіх етапах реалізації Проєкту. 4. Підготовка усіх необхідних документів до відповідних органів та отримання документу, що підтверджує готовність об'єкта до експлуатації.	2	2	4
Етап експлуатації				
Порушення вимог безпеки	Відповідальна особа за охорону праці та техніку безпеки ДПТНЗ проводитиме перевірку дотримання вимог ОП та	3	2	6

	ТБ у відповідності до чинних НПА України, а також наказів МОН у сфері ОП та ТБ: від 26.12.2017 № 1669, від 18.04.2006 № 304, від 15.08.2016 № 974 тощо.			
Виникнення скарг від громади	Місцеві громади навчатимуться для того, щоб зменшити такий потенційний ризик; положення ПВЗС будуть дотримані; Підрядник дотримуватиметься вимог відповідності будівельних робіт проєктним умовам. Підрядник має відновити місце роботи, а також інфраструктуру у разі її пошкодження; пандуси повинні бути побудовані так, щоб задовольняти вимоги маломобільних груп населення	2	2	4
Ризик виникнення аварійних ситуацій	Підрядник повинен розробити та впровадити процедури евакуації на випадок надзвичайної ситуації, що загрожує життю та здоров'ю, та план дій, які необхідно вжити у разі аварії чи інциденту; Підрядник повинен проводити інструктажі та навчання з техніки безпеки; Підрядник гарантуватиме усунення всіх дефектів, які виникають після завершення будівельних робіт	3	1	3
Неналежне поводження з відходами	Усі побутові відходи слід сортувати, розмішувати у відведених для них місцях зберігання відповідно до вимог чинного законодавства України та належним чином утилізувати організаціями зі збору відходів; документація щодо поводження з відходами буде зберігатися для підтвердження належного поводження з відходами	2	2	4

З огляду на невеликий масштаб СП, тимчасовий характер екологічних та соціальних ризиків та впливів та відповідну помірність екологічних та соціальних наслідків, розташування місця проведення робіт в межах міста Вінниця, де поблизу відсутні об'єкти культурної спадщини, природоохоронні зони, зворотній характер впливів, що будуть пом'якшені або усунені, а також керованість діяльності з реалізації СП на кожному етапі проєктного циклу (Реципієнтом за сприяння УФСІ розроблено План екологічного та соціального менеджменту (далі – ПЕСМ), Підрядником буде розроблено ПЕСМ Підрядника. Усі заходи з пом'якшення впливу підлягатимуть моніторингу та контролю з боку УФСІ, Реципієнта, Підрядника, Вінницької ОДА у межах, вказаних у зазначених документах), рівень ризику СП оцінюється як помірний (категорія В).

5. ПЛАН ЕКОЛОГІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

ПЕСМ підготовлено з метою детального опису заходів, які необхідно вжити під час реалізації та функціонування проекту з метою усунення несприятливих екологічних та соціальних впливів, або зведення їх до прийняттого рівня та дій, необхідних для впровадження цих заходів.

Усі заходи пом'якшення, зазначені в Таблиці 4.4, відображені в цьому ПЕСМ.

ІНСТИТУЦІЙНІ ТА АДМІНІСТРАТИВНІ УМОВИ		
НАЗВА СП	№ 22-05-3 «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище, м. Вінниця, Вінницька обл./ EU4Skills» Юридична адреса: 21009, м. Вінниця, вул. Стрілецька, 5 Адреса об'єкта будівництва: 21009, м. Вінниця, вул. Стрілецька, 5	
Склад/зміст діяльності в рамках СП	У результаті реалізації СП буде проведено капітальний ремонт приміщень ДПТНЗ за адресою: м. Вінниця, вул. Стрілецька, 5 та облаштування обладнанням навчальних лабораторій за професіями: оператор з обробки інформації та програмного забезпечення; електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно обчислювальних машин; радіоелектроніка та радіовимірювання	
Відповідальні особи (ПІБ та контактна інформація)	Виконавчий директор УФСІ	Лактіонов Андрій Олександрович 04071, м. Київ, вул. Лук'янівська, буд. 77, пов. 3 Телефон: +380443566550 Електронна пошта: office@usif.ua https://usif.ua/
	Координатор проєкту	Шкіль Юрій Анатолійович 04071, м. Київ, вул. Лук'янівська, буд. 77, пов. 3 Телефон: +380675380179 Електронна пошта: yu.shkil@usif.ua https://usif.ua/
Особи, відповідальні за впровадження СП (ПІБ та контактна інформація)	Керівник закладу професійної/професійно-технічної освіти	Директор ДПТНЗ «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище» Дмитрик Олександр Дмитрович 21009, м. Вінниця, вул. Стрілецька, 5 Телефон: +38 0432 612332 Електронна адреса: vmvpu.vn.ua@gmail.com Сайт: http://vmvpu.vn.ua/

	Керівник групи впровадження субпроекту	Шулик Ярослав Іванович 04071, м. Київ, вул. Лук'янівська, буд. 77, пов. 3 Телефон: +380504212666 Електронна пошта: ya.shulyk@usif.ua https://usif.ua/
	Інженер з впровадження СП	Головенько Олександр Васильович 30000, Хмельницька обл., м. Славута, вул. Сокола, б. 8, кв. 29 Телефон: +380676872952 Електронна пошта: o.golovenko@usif.ua https://usif.ua/

Потенційний вплив	Контрольний перелік кращих практик і заходів з пом'якшення впливів	Що? (моніторинг якого параметра буде здійснюватися?)	Де (буде здійснюватися моніторинг параметра?)	Як (буде здійснюватися моніторинг параметра?)	Коли (вказіть частоту, або вкажіть, що моніторинг ведеться постійно)	Хто (відповідає за виконання / моніторинг?)	Дата та результат моніторингу	План заходів у разі невиконання параметру
Етап підготовки до реалізації СП								
Нехтування екологічними та соціальними аспектами під час підготовки ПКД	1. Технічне / інженерне проектування субпроектів є ресурсоефективним, орієнтованим на запобігання забрудненню навколишнього середовища і передбачає заходи адаптації до зміни клімату. Проектування містить стійкі екологічно чисті, доступні та інклюзивні рішення, створені на основі найкращих доступних технологій / належної практики в галузі. 2. Для усіх СП у складі проектної документації буде розроблено розділ ОВНС. 3. Проектант розробить розділ «Проект організації будівництва», що міститиме рішення щодо організації будівництва в	Дотримання вимог договору з виготовлення ПКД та завдання на проектування	За місцем знаходження сторін договору	Отримання та затвердження звітів	Відповідно до вимог договору	Консультант и УФСІ		

	цілому, заходи пожежної безпеки та план з охорони праці. 4. Відповідно до вимог ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» Підрядник розробляє Програму робіт, яка, зокрема, включатиме заходи щодо безпечного виконання робіт, а також положення ПЕСМ Підрядника. 5. УФСІ розробить специфікацію з управління охороною навколишнього середовища, соціального забезпечення, охорони праці та техніки безпеки (ESHS) при виконанні робіт як частину тендерної документації на будівництво. 6. Реципієнт за допомогою УФСІ розробить ПЕСМ. 7. У ПКД забезпечити дотримання вимог щодо врахування потреб маломобільних груп населення. 8. Проведення відбору зразків будівельних матеріалів та конструкцій, проведення їх лабораторного аналізу на вміст та стан азбесту, надання відповідних рекомендацій закладу	Наявність АВМ, їх тип, стан, кількість та зміст	В приміщеннях закладу, що ремонтуються	Вибірка, аналіз основної маси зразків	До початку робіт	Консультант и УФСІ		
Недотримання вимог щодо залучення зацікавлених сторін	1. УФСІ розроблено ПВЗС з метою виявлення, залучення зацікавлених сторін та розкриття інформації. 2. Проєкт ПВЗС оприлюднено з метою виявлення думок зацікавлених сторін щодо подальшої ефективної взаємодії в рамках Проєкту. 3. УФСІ укладено договір із консультантом на надання послуг з проведення комунікаційної кампанії у рамках Проєкту. 4. Реципієнтом за допомогою УФСІ розроблено ПЕСМ. 5. Громадськість інформована про всі етапи реалізації СП.	Розроблення та оприлюднення проєкту ПВЗС Громадськість буде інформована про всі етапи реалізації Проєкту	На інформаційних ресурсах УФСІ, місцевих органів влади, ОМС На інформаційних ресурсах УФСІ, місцевих органів влади, ОМС, на об'єкті	Перевірка Перевірка	До початку робіт До початку робіт	Консультант и УФСІ Консультант и УФСІ, реципієнт, ОМС та МОВ		

	6. Розробка і впровадження у тестовому режимі механізму опрацювання скарг, механізм опрацювання скарг представлено на рівні громади та на рівні УФСІ для отримання зворотного зв'язку від зацікавлених сторін та доопрацювання представленого МРС 7. Організовано процес реєстрації та розгляду скарг на всіх рівнях впровадження СП 8. Проведено опитування зацікавлених сторін щодо їх думки стосовно ризиків реалізації СП, а також їх очікувань стосовно результатів реалізації СП. 9. Виявлення та оприлюднення можливих збоїв та їхньої тривалості.	Проведення опитування зацікавлених сторін щодо ризиків та очікувань від реалізації СП Розробка та впровадження у тестовому режимі механізму розгляду скарг Організація обліку та процесу реагування на скарги	На інформаційних ресурсах, на об'єкті На інформаційних ресурсах УФСІ, місцевих органів влади, ОМС, на об'єкті В адміністрації Реципієнта, в офісах УФСІ	Перевірка, заповнені опитувальники Перевірка Документування	До початку робіт До початку робіт До початку робіт	Консультант и УФСІ, реципієнт ЦО УФСІ, керівник ГВП реципієнт ЦО УФСІ, керівник ГВП, реципієнт		
Порушення правил повідомлення відповідних місцевих органів та громадськості та процедури отримання дозволу на будівництво Недотримання національних вимог щодо отримання дозволу	1. Місцеві будівельні інспекції повідомлено про плановану діяльність. 2. Громадськість повідомлена через засоби масової інформації та/або у загальнодоступних місцях (у тому числі на місці робіт) про плановану роботу. 3. Усі передбачені законом дозволи на будівництво та/або відновлення отримані.	Отримання дозволу на початок будівельних робіт	На об'єкті	Перевірка документів	До початку робіт	Підрядник, Реципієнт, ОДА, ГВП		
Етап будівництва								

Недотримання вимог охорони та безпеки праці, пожежної безпеки	1. Усі роботи будуть проводитися безпечно та з дотриманням дисципліни, щоб звести до мінімуму вплив на сусідніх мешканців і довкілля. 2. Засоби індивідуального захисту робітників відповідають міжнародній практиці (завжди каски, маски, за потреби захисні окуляри, страхові пояси та захисне взуття), у тому числі ті, що застосовуються під час монтажу та введення в експлуатацію обладнання. 3. На об'єкті будуть стенди з інформацією про основні правила виконання робіт. 4. Керування обладнанням та технікою здійснюватиметься навченим та досвідченим персоналом для зниження ризиків нещасних випадків. 5. Впровадження у практику та дотримання рекомендацій ВООЗ та прийнятих урядом заходів щодо захисту від COVID-19: використання одноразових масок, рукавичок, гігієна рук, провітрювання приміщення, недопущення до робочих місць осіб з ознаками хвороби, дотримання дистанції, за можливості проходження процедури вакцинації тощо. 6. Призначення відповідальної особи від Підприємця за дотримання зазначених заходів. 7. Ведення обліку випадків захворювання на COVID-19 серед працівників, інформування відповідних органів. 8. Підприємець забезпечує перебування обладнання, інструментів та техніки у належному робочому стані. 9. Підприємець забезпечить проведення інструктажів, навчання та перевірку	Належне огороження, встановлення попереджувальних знаків	На об'єкті та довкола нього	Візуальна перевірка	До початку робіт, періодично, за потреби	Підприємець, реципієнт, інженер з впровадження ГВП		
		Захисне обладнання робітників, безпека інструментів, належне рихтування тощо	На робочих місцях	Візуальна перевірка	Кожного дня Періодично	Підприємець реципієнт, інженер з впровадження ГВП		
		Дотримання вимог безпеки у зв'язку із розповсюдженням COVID-19 (користування масками, рукавичками, провітрювання, дотримання вимог гігієни, тощо)	На об'єкті	Візуальна перевірка	Кожного дня Періодично	Підприємець Реципієнт, керівник ГВП		
		Стан здоров'я робітників	На об'єкті	Опитування, замір	Щоденно	Підприємець		

	знань з питань охорони праці та техніки безпеки свого персоналу (у т.ч. щодо надання домедичної підготовки та правил поведінки у разі виникнення аварій). 10. Дотримання вимог з охорони праці відповідно до чинного законодавства та нормативних документів України під час монтажу / введення в експлуатацію обладнання. Пожежна безпека: 11. Призначається особа, відповідальна за протипожежний захист. 12. Процедури у випадку пожежі мають бути відомими усім працівникам. Працівники повинні на регулярній основі проходити навчання на випадок виникнення пожежі та з використання вогнегасників. 13. Будівельний майданчик повинен бути оснащений протипожежним обладнанням, а саме, вогнегасниками та протипожежними щитами з необхідним обладнанням, контейнерами для забезпечення пожежогасіння для зберігання води та гідрантами для систем подачі води.			температури, візуальна перевірка				
Недотримання умов праці	1. Підрядник забезпечить для свого персоналу систему моніторингу часів роботи. 2. Підрядник забезпечить наявність копій трудових договорів/трудоx книжок та паспортів працівників Підрядника на об'єкті. 3. Підрядник повинен розробити та впровадити внутрішню політику та процедуру, щоб гарантувати, що жоден працівник не буде підданий дискримінації або домаганням.	Копії трудових договорів або трудових книжок та паспортів персоналу Підрядника	На об'єкті	Перевірка документів	Періодично	Керівник ГВП		

	4. Підрядник забезпечить персоналу відповідне проживання та прийнятні санітарно-гігієнічні умови відповідно до вимог IFC/EBRD. 5. Механізм розгляду скарг ля персоналу буде розроблений та представлений відповідно до СЕС2.							
Забруднення повітря, у т.ч. за рахунок пилоутворення	1. Під час розбирання внутрішніх перегородок вище першого поверху використовуватимуться жолоби для скидання сміття. 2. Сміття від розібраних конструкцій триматиметься в контрольованій зоні і збризкуватиметься водою, щоб зменшити пилоутворення. 3. Пилоутворення буде зменшено під час роботи пневматичними інструментами, шляхом постійного розбризкування води та/або шляхом використання протипилових екранів. 4. Територію навколо об'єкта (тротуари, автошляхи) триматимуться чистою, щоб уникнути пилоутворення. 5. На об'єкті не допускатиметься будь-яке відкрите горіння. 6. Будівельна техніка не повинна працювати вхолосту.	Пил від демонтажу долається за допомогою спринклерів з водою	На об'єкті, під'їзні дороги	Візуальна перевірка	Під час демонтажу	Підрядник, реципієнт, інженер з впровадженн я ГВП		
Шумове забруднення, вібрація	1. Роботи з високим рівнем шуму будуть виконуватися лише протягом часу, узгодженому в дозволі та Програмі робіт, розробленої Підрядником. 2. В процесі роботи кришки двигунів, генераторів, компресорів та іншого обладнання будуть закриті, а обладнання має встановлюватися якомога подалі від житлової забудови.	Час роботи обладнання, зокрема техніки, автомобілів, що здійснюють постачання (лише під час періодів, вказаних у дозволі та Програмі робіт)	На об'єкті	Перевірка, вимірювання	Періодично	Підрядник, реципієнт, інженер з впровадженн я ГВП		

Забруднення підземних вод	Стічні води з будівельного майданчика мають бути очищені Підрядником перед викидом у поверхневі водотоки, або водойми. Зберігання, використання та утилізація Підрядником хімічних речовин (таких як олія, фарби, паливно-мастильні матеріали, бетонні розчини тощо) проводяться з метою мінімізації потраплянні їх у стічні води.	Заходи проти водної ерозії та захисту води є в наявності (якщо це потрібно) Витоки води, розливи мастил та мастильних матеріалів	На об'єкті На об'єкті	Візуальна перевірка Візуальна перевірка	Періодично Щотижня	Підрядник, реципієнт, інженер з впровадженн я ГВП Підрядник, реципієнт, інженер з впровадженн я ГВП		
Пошкодження рослинного покриву	З метою пом'якшення ризиків пошкодження рослинності, Підрядник надасть Програму робіт, погоджену представником УФСІ. Ці документи повинні відповідати вимогам ESHS Специфікації до Контракту і зокрема, наступним положення (зазначений перелік не є вичерпним): На місці проведення робіт необхідно проводити інвентаризацію місцевих дерев (наприклад, фотофіксація), і будь-яка можливість заподіяння шкоди цим деревам повинна бути передбачена. Усі дерева на будівельному майданчику на прилеглий території будуть позначені в генеральному плані будівництва і під час будівництва слід вживати заходів для їх збереження. З метою збереження дерев у зоні виконання робіт не допускається: - забивати в стовбури дерев цвяхи, штирі та ін. для кріплення знаків, огорожень, дротів і т. ін.; - прив'язувати до стовбурів або гілок дріт для різних цілей; - закопувати або забивати стовпи, кілки, палі в зоні активного розвитку дерев;	Інвентаризація дерев	На об'єкті	Документування, Візуальна перевірка	До початку робіт	Підрядник, інженер з впровадженн я ГВП		

		- складати під кроною дерева матеріали, конструкції, ставити будівельні машини та вантажні автомобілі. - У зоні радіусом 10 м від ствола не допускається: - зливати пально-мастильні матеріали, окрім спеціальних ємностей з подальшою утилізацією спеціалізованим підприємствам; - встановлювати працюючі машини; - складувати на землі хімічно активні речовини (солі, хімікати та ін.). При необхідності, знесення зелених насаджень слід проводити у суворій відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України №1045 від 01.08.2006 р. «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах».						
Неналежне поводження з відходами	3	1. Збір відходів та шляхи і ділянки тимчасового зберігання та утилізації будуть визначені для всіх основних видів відходів, які очікуються від робіт по розбиранню конструкцій і будівництва. 2. Мінеральні будівельні відходи та відходи від розібраних конструкцій будуть відокремлені від загального сміття, органічних, рідких і хімічних відходів шляхом сортування безпосередньо на місці і зберігання різних відходів у відповідних контейнерах. 3. Будівельні відходи будуть зібрані та утилізовані належним чином ліцензованими організаціями зі збору відходів. 4. Документація щодо проведення утилізації відходів буде вестись для	Будівельні побутові відходи збираються окремо і своєчасно вивозяться ліцензованою компанією	На об'єкті	Візуальна перевірка, документація ліцензованої компанії	Періодично	Підрядник, реципієнт, інженер з впровадженн я ГВП	

	підтвердження належного поводження з відходами.							
Неналежне поводження з небезпечними відходами	Якщо на місці ведення робіт будуть тимчасово зберігатися небезпечні або токсичні матеріали, вони будуть поміщені в безпечні контейнери та чітко позначені як небезпечний матеріал з інформацією про склад, властивості; контейнери з небезпечними матеріалами поміщають у герметичний контейнер для запобігання впливу на навколишнє середовище (пролиття, викиди, тощо). 2. Небезпечні відходи мають бути вивезені та видалені спеціалізованою ліцензованою організацією. 3. Використання АВМ в проєктах УФСІ заборонено.	Належне зберігання і вивезення та утилізація небезпечних відходів	Будівельний майданчик	Візуальна перевірка документація ліцензованої компанії	Періодично Періодично	Підрядник, інженер з впровадженн я ГВП Підрядник, інженер з впровадженн я ГВП		
Несподіване виявлення азбесту	1. Роботи слід негайно припинити. 2. Доступ на територію повинен бути обмежений. 3. Відповідальні особи будуть проінформовані та вжито необхідних заходів для визначення характеристик матеріалу (чи містить азбест, його тип, стан тощо). 4. Якщо матеріал дійсно містить азбест, то з ним слід поводитися відповідно до встановлених рекомендацій та методологій, розроблених для УФСІ кваліфікованим міжнародним експертом з управління азбестом (The Method Statement). 5. Будь-яка особа, яка може зазнати впливу, буде попереджена, кожен, хто не носить засоби індивідуального захисту (ЗІЗ), у тому числі засоби захисту органів дихання (ЗІЗ), негайно покине зону ураження та проведе процедуру дезактивації.	Належне поводження з АВМ у випадку несподіваного виявлення	Будівельний майданчик	Візуальна перевірка	Періодично	Підрядник, інженер з впровадженн я ГВП		

	6. Поширення азбесту буде зведено до мінімуму.							
Загрози для руху транспорту та пішоходів під час виконання будівельних робіт вздовж території, де розташований будівельний об'єкт	Відповідно до національних нормативів Підрядник гарантує, що будівельний майданчик належним чином буде захищений, а рух будівельного транспорту буде регулюватися. Це обов'язково включає такі заходи, але не обмежується ними: 1. Установка дорожніх знаків, попереджувальних знаків, бар'єрів і об'їздів: об'єкт буде чітко видимим, а громадськість буде попереджена про всі потенційні небезпеки. 2. Буде розроблена схема дорожнього руху, проведено інструктаж персоналу. Будуть забезпечені безпечні переходи для пішоходів в місцях перетину з рухом будівельного транспорту. 3. Під час будівництва буде забезпечений безпечний і безперервний доступ до всіх прилеглих споруд та житлових будинків. 4. Пристосування робочого часу до місцевих схем руху транспортних засобів, тобто уникнення основної транспортної діяльності протягом годин пік.	Належне встановлення вказівників, огорожа будівельного майданчику, бар'єри, попереджувальні об'єкти	Будівельний майданчик, під'їзні дороги	Спостереження	Щотижня	Підрядник, реципієнт, інженер з технагляду, керівник ГВП		
Порушення комфорту проживання місцевого населення	1. Дотримання встановленого графіку проведення будівельних робіт. 2. За необхідності встановлення шумозахисних екранів поблизу будівельного обладнання. 3. Організація безпечного руху для місцевих мешканців, у т.ч. шляхом встановлення дорожніх знаків, попереджувальних знаків, бар'єрів і об'їздів, встановленням попереджувальних знаків і таблиць, влаштуванням необхідного	Дотримання встановленого графіку проведення будівельних робіт	На об'єкті	Візуальна перевірка	Періодично	Інженер з впровадження ГВП		

	огороження та перехідних містків, відповідного освітлення в нічну пору доби для того, щоб об'єкт було чітко видно, а громадськість була попереджена про всі потенційні небезпеки. 4. Заздалегідь попереджати місцевих мешканців та інших зацікавлених сторін про виникнення додаткових незручностей з вказанням чіткого часу на їх усунення.							
Порушення вимог безпеки для місцевого населення	1. Всі будівельні роботи здійснюватимуться у суворій відповідності до проєктних умов та тільки в межах будівельного майданчика. 2. Організація безпечного руху для місцевих мешканців, у т.ч. шляхом встановлення дорожніх знаків, попереджувальних знаків, бар'єрів і об'їздів, встановленням попереджувальних знаків і таблиць, влаштуванням необхідного огороження та перехідних містків, відповідного освітлення в нічну пору доби для того, щоб об'єкт було чітко видно, а громадськість була попереджена про всі потенційні небезпеки. 3. Суворе дотримання вимог техніки безпеки та пожежної безпеки працівниками Підрядника.	Роботи здійснюються в межах будівельного майданчика	На об'єкті	Візуальна перевірка	Періодично	Підрядник, Інженер з впровадженн я ГВП		
Виникнення соціальної напруги через брак інформації щодо проєкту та відсутності загальновідомого та доступного	1. Громадськість буде проінформована про хід впровадження СП на всіх етапах впровадження СП відповідно до вимог ПВЗС. 2. Інформація буде розповсюджуватися, а канали подання скарг / претензій публікуватися через інформаційні дошки для громадськості, інформаційні	Інформація про проєкт чітко вказана на будівельному майданчику, уся інформація доступна у	Будівельний майданчик, громадська приймальня	Спостереження	Періодично	Підрядник, реципієнт, керівник групи впровадженн я та інженер з впровадженн я ГВП		

каналу для подання скарг/звернень та виникнення незручностей у провадженні навчального процесу	пункти проекту та веб -сайти закладу та місцевої влади; додатково, з початком будівництва, на будівельному майданчику буде встановлено скриньку для подання скарг, а інформація буде розміщена в громадських місцях на об'єкті; МРС буде розроблено та впроваджено у тестовому режимі; МРС буде представлено на рівні громад та на рівні УФСІ для отримання зворотного зв'язку від зацікавлених сторін та перегляду МРС; організовано процес запису та реагування на скарги. 3. З місцевим населенням проводитимуться пояснювальні роботи, проводитимуться інструктажі з техніки безпеки та навчання. 4. Буде неухильно дотримано встановленого графіка будівництва, гарантуючи, що будівельні роботи будуть виконуватися тільки в межах будівельного майданчика. 5. У разі необхідності припинення надання комунальних послуг мешканцям, які проживають у безпосередній близькості від будівництва, таку потребу слід узгодити з власником комунальних систем, а громадськість повинна бути проінформована про це принаймні за три дні до такого припинення та терміни відновлення. 6. Керівництво закладу налагодить навчальний процес та адаптує навчальний план/розклад з метою уникнення зайвого навантаження у зв'язку із шумом, вібрацією та пилом, непотрібного переміщення учнів та викладачів між навчальними аудиторіями закладу.	місцевих органах влади	УФСІ	Документування	Одразу після надходження	Реципієнт, керівник групи впровадження та інженер з впровадження ГБП		
		Своєчасне опрацювання скарг						
		Адаптований навчальний план/розклад	На об'єкті	Перевірка документів	До початку робіт та у строки затвердження таких планів/розкладів	Реципієнт, керівник ГБП		

	7. Педагогічно-адміністративний персонал та учні будуть інформовані про відповідні зміни у навчальному плані/розкладі. 8. Реципієнт разом із Підрядником проведуть навчання з питань охорони праці та безпеки для вчителів, учнів та відвідувачів.							
Несвоєчасне завершення будівельних робіт та введення об'єкта в експлуатацію	1. Здійснення періодичного контролю термінів будівництва та якості та відповідності будівельних робіт ПКД. 2. Моніторинг стану виконання заходів з пом'якшення екологічного та соціального впливу. 3. Взаємодія із зацікавленими сторонами на всіх етапах реалізації Проекту. 4. Підготовка усіх необхідних документів до відповідних органів та отримання документу, що підтверджує готовність об'єкта до експлуатації.	Отримання Сертифікату про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта	На об'єкті	Перевірка документів	Після завершення будівельних робіт	Реципієнт, Підрядник, ГВП		
Етап експлуатації								
Порушення вимог безпеки	Відповідальна особа за охорону праці та техніку безпеки ДПТНЗ проводитиме перевірку дотримання вимог ОП та ТБ у відповідності до чинних НПА України, а також наказів МОН у сфері ОП та ТБ: від 26.12.2017 № 1669, від 18.04.2006 № 304, від 15.08.2016 № 974 тощо.	Дотримання вимог безпеки праці, охорони праці та пожежної безпеки	На об'єкті	Верифікація даних у результаті фіксації: зареєстрованих нещасних випадків, аварій, отриманих скарг та пропозицій	періодично	Реципієнт		
Виникнення скарг від громади	1. Проведення роз'яснювальної роботи із місцевим населенням. 2. Дотримання положень ПВЗС, попередньо обговореного і погодженого із зацікавленими сторонами.	Опрацювання скарг	На об'єкті	Перевірка журналів обліку скарг	Відповідно до чинного законодавства та МРС	Реципієнт		



	3. Дотримання Підрядником вимог відповідності будівельних робіт проєктним умовам. 4. Відновлення Підрядником пошкоджених об'єктів інфраструктури та місця робіт загалом. 5. Облаштування пандусів з умовами дотримання вимог маломобільних груп населення.							
Ризик виникнення аварійних ситуацій	1. Підрядник розробить і впровадить процедури евакуації на випадок надзвичайних ситуацій, пов'язаних із небезпекою для життя та охороною здоров'я та план дій, які мають бути вжиті у випадку аварії або інциденту. 2. Підрядник проведе навчання та тренінги з питань безпеки. 3. Підрядник гарантує усунення всіх недоліків, що виникнуть після завершення будівельних робіт впродовж дефектного періоду завершення будівельних робіт.	Виникнення аварійних ситуацій	На об'єкті	Моніторинг, перевірка проведення тренінгів та інструктажів з охорони праці та техніки безпеки	Відповідно до чинного законодавства	Реципієнт		
Неналежне поводження з відходами	1. Усі побутові відходи слід сортувати, розміщувати у відведених для них місцях зберігання відповідно до вимог чинного законодавства України та належним чином утилізувати організаціями зі збору відходів. 2. Документація щодо поводження з відходами буде зберігатися для підтвердження належного поводження з відходами.	Усі побутові відходи сортуються та належним чином утилізувати організаціями зі збору відходів	На об'єкті	Візуальна перевірка, документи ліцензованої компанії	Періодично	Реципієнт		

6. Взаємодія із зацікавленими сторонами, оприлюднення інформації та опрацювання скарг та звернень зацікавлених сторін.



В рамках СП ідентифіковано наступні зацікавлені сторони: педагогічно-адміністративний склад ДПТНЗ, учні ДПТНЗ та їх батьки, МОН, УФСІ, KfW, Вінницька ОДА, Вінницький обласний центр зайнятості, мешканці житлових будинків № 3, 5 по вулиці Талаліхіна, № 1 по вулиці Стрілецькій, що розташовані неподалік від об'єкта, комерційна забудова: медичний центр «Інномед», центр оптики та офтальмології BonOptic, центр реабілітації хребта та суглобів «АКСІС», центр хірургії доктора Кобякова, гуртожиток ДПТНЗ, проектна організація, що обрана за результатами тендерного відбору, громадські організації, інші мешканці міста, потенційні учні та їх батьки, будівельна організація, що буде обрана за результатами проведення тендерного відбору.

З метою інформування громадськості щодо заходів в рамках СП, його мети та каналів для зворотного зв'язку 09.12.2021 було проведено громадські консультації.

Усі зацікавлені сторони були запрошені на громадські консультації шляхом розміщення на веб-сайтах та зазначених об'єктах відповідних оголошень:

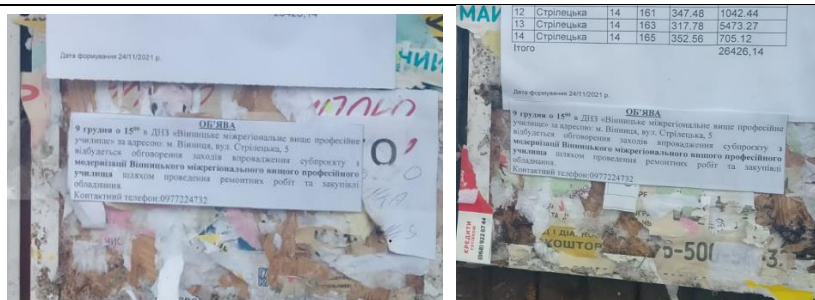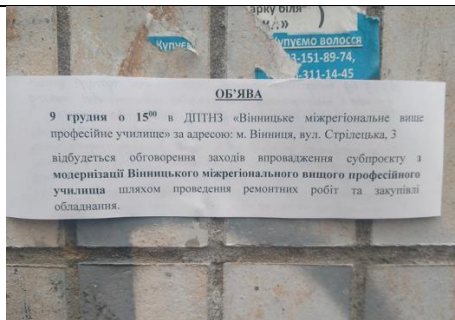Розміщення повідомлення на веб-сайті ДПТНЗ	http://vmvpu.vn.ua/news/2021/11/22/%D0%94%D0%BE-%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B2-%D0%BC-%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F/																								
Розміщення повідомлення на веб-сайті Вінницької ОДА	http://www.vin.gov.ua/news/oholoshennia/41600-oholoshennya-25-11-2021																								
Розміщення оголошення на парадних житлових будинків	 <table data-bbox="1091 1276 1362 1330"><tr><td>12</td><td>Стрілецька</td><td>14</td><td>161</td><td>347.48</td><td>1042.44</td></tr><tr><td>13</td><td>Стрілецька</td><td>14</td><td>163</td><td>317.78</td><td>5473.27</td></tr><tr><td>14</td><td>Стрілецька</td><td>14</td><td>165</td><td>352.56</td><td>705.12</td></tr><tr><td colspan="5">Ітого</td><td>26426.14</td></tr></table>	12	Стрілецька	14	161	347.48	1042.44	13	Стрілецька	14	163	317.78	5473.27	14	Стрілецька	14	165	352.56	705.12	Ітого					26426.14
12	Стрілецька	14	161	347.48	1042.44																				
13	Стрілецька	14	163	317.78	5473.27																				
14	Стрілецька	14	165	352.56	705.12																				
Ітого					26426.14																				
Розміщення оголошення поруч із Вінницьким обласним центром зайнятості																									

Розміщення оголошення поруч із комерційною забудовою

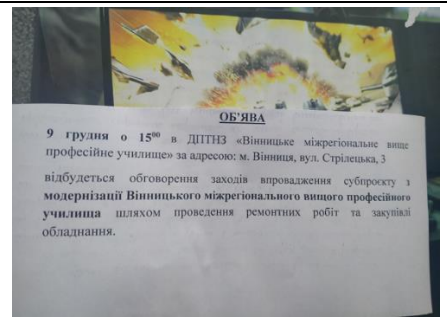

З метою виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», задля дотримання вимог безпеки стосовно попередження поширення COVID-19 громадські консультації проходили у змішаному форматі (основний формат був – онлайн на платформі Zoom за часткової безпосередньої присутності учасників консультацій у приміщенні ДПТНЗ). На консультаціях були присутні 92 особи: представники ДПТНЗ: педагогічно-адміністративний склад, учні ДПТНЗ та їх батьки. За результатами громадських консультацій складено протокол від 09.12.2021, що наведений у Додатку 2.

З метою виявлення загального ставлення до СП, інформованості про заходи СП, а також рівня задоволеності педагогічно-адміністративного персоналу та учнів ДПТНЗ і їх батьків процесом комунікації щодо заходів СП, а також їх очікувань щодо результатів реалізації СП у період з 04.11.2021 року по 30.11.2021 року було проведено опитування педагогічно-адміністративного персоналу (далі – педагоги), учнів ДПТНЗ та їх батьків (далі - учні). Всього в опитуванні взяли участь 97 педагоги та 250 учня.

За результатами опитування можна зробити наступні висновки:

- 1) Загалом ЗС обізнані щодо впровадження СП та запланованих заходів в рамках СП (педагоги: на 95,8% та 80,2% відповідно, учні: на 75,8% та 56,7% відповідно).
- 2) Близько 40,6% педагогів та 63,3% учнів оцінили стан будівлі закладу як задовільний, більше 56% педагогів та 33% учнів вважають, що будівля закладу потребує ремонту, близько 75% учнів вказали, що обладнання/техніка/інструмент потребують оновлення.
- 3) Близько 44% педагогів та 58% учнів оцінили потенційні ризики СП як помірні, 43 % педагогів та 17% учнів оцінили потенційні ризики СП як низькі, суттєвими ризики вважають близько 14% педагогів та 21% учнів.
- 4) Близько 34% педагогів та учнів вважають, що жодних ризиків протягом реалізації СП не виникатиме. Однак респондентами було виділено наступні ризики: виникнення незручностей у провадженні навчального процесу (19,8% педагогів та 16,9% учнів), незручності у зв'язку із

- підвищеним рівнем шуму, виникненням пилу (17,7% педагогів та 6,4% учнів), незручності у зв'язку із обмеженням доступу до певної території або приміщень ДПТНЗ (14,6% педагоги та 10,4% учні), незручності у зв'язку із перебуванням на території закладу сторонніх осіб (19,3% учнів). Із цими ризиками респонденти пов'язали основні складнощі та незручності, що потенційно можуть виникнути протягом реалізації СП.
- 5) Близько 87% педагогів та учнів задоволені комунікацією з виконавцями заходів у рамках СП.
 - 6) Близько 47% педагогів та 38% учнів визначають сайт ДПТНЗ як найприйнятніший спосіб комунікації, спосіб інформування про хід виконання СП (близько 72% педагогів та 45% учнів) та метод розкриття інформації (близько 83% педагогів та 80% учнів).
 - 7) Близько 66% педагогів та 59% учнів знають де можна ознайомитися із ПВЗС (у т.ч. МРС), 60% педагогів та 70% учнів зрозумілий механізм подання скарг.
 - 8) Серед очікувань, вказаних педагогами, були: модернізований заклад освіти із сучасними лабораторіями та сучасним обладнанням; підвищення конкурентоспроможності закладу та учнів; комфортність та зручність у впровадженні навчального процесу; покращення умов праці.
 - 9) Серед очікувань, вказаних учнями, були: отримання якісної освіти з використанням новітніх технологій; покращення знань та професійної компетенції; сучасне обладнання та інструмент; сучасний ремонт закладу; модернізація комп'ютерних класів.

Після введення об'єкта в експлуатацію планується проведення опитування зазначених вище груп респондентів з метою виявлення рівня задоволеності реалізованими заходами в рамках СП та відповідність очікувань фактичним результатам в рамках СП.

На даному етапі реалізовано наступні дії щодо розкриття інформації в рамках субпроєкту:

- розкриття інформації про проєкт та заходи субпроєкту на сайті ДПТНЗ <http://vmvpu.vn.ua/activity-organisation/EU4Skills/%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8F.html> ;

- розкриття ПВЗС, у т.ч. МРС на веб-сайтах УФСІ та ДПТНЗ для публічного обговорення (обговорювалося під час громадських консультацій 09.12.21, оприлюднено на веб-сайті УФСІ 20.09.21, на веб-сайті ДПТНЗ 08.11.2021

- http://vmvpu.vn.ua/files/dl/UE4Skills_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%97%20%D1%96%D0%B7%20%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf);

- визначено та оприлюднено відповідальну особу з боку ДПТНЗ за прийняття та розгляд скарг та звернень (оприлюднено на сайті ДПТНЗ

Подальша взаємодія із зацікавленими сторонами відбуватиметься відповідно до Плану взаємодії із зацікавленими сторонами в рамках Проєкту наступним чином:

Перелік інформації, що розкривається та напрями консультацій, термін розкриття	Запропоновані методи	Цільові групи ЗС	Відповідальні особи
розкриття версій ОЕСВ (у т.ч. ПЕСМ) після погодження з KfW	Оприлюднення на веб-сайтах УФСІ, обласної державної адміністрації та закладу для обговорення	Усі зацікавлені сторони	Спеціаліст з моніторингу та оцінки, екологічних та соціальних питань
Роз'яснення вимог тендерної документації, у т.ч. в частині вимог охорони навколишнього середовища, соціального забезпечення, охорони праці та техніки безпеки Після оголошення тендеру у визначені ТД строки	Проведення перед-тендерної наради, надання роз'яснень та відповідей на запитання учасників	представники учасників тендеру	Координатор Проєкту, спеціаліст із закупівель, спеціаліст з моніторингу та оцінки, екологічних та соціальних питань, керівник групи впровадження Проєкту у регіоні
Питання здійснення заходів з впровадження Проєкту (за необхідності) на постійній основі	консультації, зустрічі	Персонал Реципієнта, ОДА, ОМС, місцева громада	Керівник групи впровадження Проєкту у регіоні, інженер з впровадження
Етап будівництва			
Інформування про зміни в навчальному плані/розкладі у зв'язку із проведенням робіт Періодично у разі зміни навчального плану/розкладу до набрання чинності таких змін	Загальні збори педагогічно-адміністративного складу та учнів, повідомлення на дошках об'яв, на веб-сайті, у месенджерах тощо	Педагогічно-адміністративний склад, учні та їх батьки, представники Підрядника	Керівництво Реципієнта

Інформація про хід реалізації Проєкту, потенційні екологічні та соціальні ризики Періодично протягом проведення робіт	Публічні повідомлення, консультації, зустрічі, електронні публікації на веб-сайтах УФСІ, ОДА, Реципієнта. Прес-релізи у національних та місцевих ЗМІ	Персонал Реципієнта, учні та їх батьки, мешканці житлової забудови, що знаходиться поруч/неподалік, власники, працівники та відвідувачі комерційних та інших нежитлових об'єктів, що знаходяться поруч/неподалік об'єкта, ОДА, ОМС	УФСІ, Підрядник, Реципієнт, ТОВ «Компанія «Брендком»
Консультації з питань здійснення заходів з впровадження Проєкту з питань дотримання вимог охорони праці та пожежної безпеки Періодично протягом проведення робіт	Онлайн навчання, тренінги, консультації, зустрічі	Представники Реципієнта	Підрядник, Керівник групи впровадження Проєкту у регіоні, інженер з впровадження
Інформування про канали для подання скарг та пропозицій До початку робіт	Розміщення скриньки для подання скарг та звернень поруч з будівельним об'єктом	Персонал Реципієнта, учні та їх батьки, мешканці житлової забудови, що знаходиться поруч/неподалік, власники, працівники та відвідувачі комерційних та інших нежитлових об'єктів, що знаходяться поруч/неподалік об'єкта, місцеві громадські організації, місцева громада	Підрядник, керівник Реципієнта, Керівник групи впровадження Проєкту у регіоні
Надання відповіді на скаргу, розгляд пропозицій ЗС (врахування чи надання обґрунтування у разі неврахування)	Письмова відповідь	скаржник	Відповідальна особа Реципієнта, Інженер з впровадження, консультант УФСІ

Протягом 15 днів з дня отримання скарги			
Інформація про основні правила виконання робіт та запобігання поширенню COVID-19 До початку робіт	Стенд на будівельному майданчику	Персонал Підрядника, персонал реципієнта, персонал УФСІ	Підрядник
Етап експлуатації			
Проведення опитування рівня задоволеності результатами Проєкту Після здачі об'єкта в експлуатацію	онлайн анкетування	Персонал Реципієнта, учні та їх батьки	Спеціаліст з моніторингу та оцінки, екологічних та соціальних питань, Керівник групи впровадження у регіоні
Основні вимоги з охорони та безпеки праці, пожежної безпеки Протягом здачі об'єкта в експлуатацію	Інформація/документи на дошках в приміщеннях Реципієнта, тренінги, інструктажі	Персонал Реципієнта, учні	Реципієнт
Інформування про канали для подання скарг та пропозицій Постійно	Розміщення інформації на веб-сайті Реципієнта	Персонал Реципієнта, учні та їх батьки, мешканці житлової забудови, що знаходиться поруч/неподалік, власники, працівники та відвідувачі комерційних та інших нежитлових об'єктів, що знаходяться поруч/неподалік об'єкта, місцеві громадські організації, місцева громада	Реципієнт
Надання відповіді на скаргу, розгляд пропозицій ЗС (врахування чи надання обґрунтування у разі неврахування)	Письмова відповідь	Персонал Реципієнта, учні та їх батьки, мешканці житлової забудови, що знаходиться поруч/неподалік, власники, працівники та	Реципієнт

Протягом 15 днів з дня отримання скарги		відвідувачі комерційних та інших нежитлових об'єктів, що знаходяться поруч/неподалік об'єкта, місцеві громадські організації, місцева громада	
Співпраця з потенційними роботодавцями Постійно протягом реалізації проєкту	Публічні повідомлення, електронні публікації на веб-сайтах ОДА, Реципієнтів, участь у нарадах, форумах, зустрічах, конкурсах, підписання меморандумів про співпрацю, проходження навчальної практики	Асоціації роботодавців, потенційні роботодавці, МОН, ОДА	Реципієнт

З метою зменшення стурбованості та досягнення взаємоузгодженого врегулювання скарг зацікавлених сторін УФСІ розробив МРС, що відповідає рівню потенційних ризиків та впливів СП.

Відповідальна особа з боку ДПТНЗ: Корженко Світлана Гаврилівна - заступник директора з навчально-виховної роботи

тел. +380977224732, електронна пошта ksg206@ukr.net

21009, м. Вінниця, вул. Стрілецька, 5

Відповідальна особа на рівні групи впровадження Проєкту у Чернівецькій та Вінницькій областях (ГВП): Головенько Олександр Васильович – інженер з впровадження субпроєктів,

тел. 067 687 29 52, електронна пошта: o.golovenko@usif.ua

Відповідальна особа на рівні ЦО УФСІ: Гришко Олександра Олександрівна - консультант з адміністративних питань та питань доброчесності

тел. +38 (044) 356-65-50, електронна пошта: office@usif.ua

<https://usif.ua/>

Критерії скринінгу Субпроекту

Перелік контрольних питань для заповнення і збереження

Назва об'єкту	Державний професійно-технічний навчальний заклад «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище» (надалі-ДПТНЗ)	
Адреса	Юридична адреса: 21009, м. Вінниця, вул. Стрілецька, 5 Адреса корпусу, що підлягає ремонту: 21009, м. Вінниця, вул. Стрілецька, 5	
Контактні дані	ПШБ – Дмитрик Олександр Дмитрович	
	Посада – директор ДПТНЗ	
	e-mail: vmvpu.vn.ua@gmail.com	тел. 0962580303
Дата заповнення	23.02.2021 р.	

№	Критерій	ТАК	НІ	У разі відповіді ТАК	У разі відповіді НІ	Примітка
1	Чи має заклад дійсні документи на здійснення діяльності: ліцензії, дозволи тощо? Якщо ні, дайте, будь ласка, пояснення. Дозволи, що підлягають перевірці: • документ, що посвідчує право власності/користування на земельну ділянку та будівлю	V		Впровадження СП	Відхилення СП	Земельна ділянка перебуває в державній власності; будівля перебуває в державній власності.
2	Чи має діючий заклад екологічні дозволи або очікує на їх отримання у разі якщо такі дозволи необхідні?		V	ПЕСМ	Впровадження СП	
3	Чи будуть у рамках субпроекту фінансовані види діяльності, що призведуть до збільшення обсягу робіт, проведення яких вимагатиме отримання екологічних дозволів?		V	ПЕСМ	Впровадження СП	

4	Чи відповідає заклад всім вимогам нормативно-правових та нормативних документів України із захисту довкілля щодо викидів у повітря, скидання води та утилізації твердих відходів? Якщо ні, дайте, будь ласка, пояснення	V		Впровадження СП	Відхилення СП	
5	Чи має заклад будь-які значні несплачені екологічні комісії, штрафи або стягнення або інші екологічні зобов'язання (наприклад, судовий процес у стадії розгляду, що стосується проблем охорони довкілля тощо). Якщо так, дайте, будь ласка, пояснення		V	Відхилення СП	Впровадження СП	
6	Чи спричинить виконання запропонованої діяльності переміщення третіх осіб, офіційне чи неофіційне зайняття або використання землі чи будівель?		V	Відхилення СП	Впровадження СП	На час проведення будівельних робіт учні навчатимуться в інших приміщеннях ДПТНЗ.
7	Чи буде діяльність в рамках субпроекту спричиняти утворення стічних вод та/або чи буде потрібно вжити заходів екологічного контролю для забезпечення дотримання чинних в Україні норм?		V	ПЕСМ	Впровадження СП	
8	Чи буде діяльність в рамках субпроекту спричиняти викиди в атмосферу та/або чи буде потрібно вжити заходів екологічного контролю для забезпечення дотримання чинних в Україні норм?	V		ПЕСМ	Впровадження СП	Внаслідок пилоутворення
9	Чи буде діяльність в рамках субпроекту спричиняти рівень шуму, що вимагатиме вживання заходів екологічного контролю для забезпечення дотримання чинних в Україні норм?	V		ПЕСМ	Впровадження СП	
	Чи буде рівень шуму негативно впливати на особливо вразливі об'єкти (природне середовище, лікарні, заклади освіти, установи для місцевого населення)?	V		ПЕСМ	Впровадження СП	

10	Чи будуть в рамках субпроекту застосовуватись, зберігатись, вироблятись, утилізуватись небезпечні речовини, які: • потребують спеціальних дозволів та ліцензій; • потребують ліцензованого та спеціально навченого персоналу; • які є незаконними або забороненими у ЄС або країнах Заходу; • не відповідають рекомендаціям Посібника щодо запобігання та усунення забруднення довкілля (РРАН); • можуть спричинити забруднення ґрунту і води, якщо не буде вжито належних заходів?	V		ПЕСМ	Впровадження СП	
11	Чи буде субпроект спричиняти утворення відходів, які потребують проведення спеціальних заходів з утилізації або залучення ліцензованих організацій? (у разі закупівлі нового обладнання, чи буде старе обладнання утилізоване уповноваженою ліцензованою компанією або організацією?)		V	ПЕСМ	Впровадження СП	
12	Чи буде запланована господарська діяльність проходити на або поряд із природоохоронними територіями/об'єктами або такими територіями/об'єктами, чий статус (надання статусу) природоохоронних територій/об'єктів розглядається органами влади?		V	Відхилення СП	Впровадження СП	
13	Чи можуть роботи в рамках цього субпроекту мати потенційний вплив на території, що є важливими для місцевої або національної культурної спадщини?		V	Відхилення СП	Впровадження СП	
14	Чи передбачається порушення рослинного покриву під час перебудови та переоснащення об'єкту?		V	ПЕСМ	Впровадження СП	
15	Чи передбачається пошкодження ґрунту, земель, погіршення ландшафту під час перебудови та переоснащення об'єкту?		V	Відхилення СП	Впровадження СП	
16	Чи виявили представники місцевого населення або неурядових організацій занепокоєння щодо екологічних аспектів субпроекту або висловили заперечення проти нього?		V	ПЕСМ	Впровадження СП	

17	Чи є будь-який інший аспект субпроекту, який за звичайних умов роботи або за певних обставин спричинить ризик, матиме негативний вплив на довкілля, населення або може спричинити незручності?		V	ПЕСМ	Впровадження СП	
18	Чи має заклад будь-які штрафи, стягнення, значні рекомендації внаслідок перевірок місцевих інспекцій з охорони праці або інші зобов'язання (наприклад, судовий процес у стадії розгляду, що стосується проблем охорони праці тощо)? Якщо так, дайте, будь ласка, пояснення		V	Відхилення СП	Впровадження СП	
19	Чи заклад реєструє та веде статистику нещасних випадків, інцидентів з охорони праці?	V		Впровадження СП	ПЕСМ	
20	Чи відстежує заклад дотримання національного законодавства з охорони праці, регламентів ЄС, організаційних політик та стандартів?	V		Впровадження СП	ПЕСМ	
21	Чи існує пряма або опосередкована небезпека для руху громадського транспорту і пасажирів протягом реалізації субпроекту?	V		ПЕСМ	Впровадження СП	
22	Чи спричиняє субпроект обмеження доступу пасажирів/пішоходам до комерційних та торгових об'єктів?		V	ПЕСМ	Впровадження СП	
23	Чи є в наявності територія для зберігання матеріалів та паркування транспорту, призначеного для проведення будівельних робіт, на існуючій ділянці/ чи забезпечені під'їзні шляхи?	V		Впровадження СП	ПЕСМ	
24	Чи існують обтяження стосовно місця, обраного для проведення будівельних/ремонтних робіт? Якщо так, надайте пояснення		V	ПЕСМ	Впровадження СП	
25	Чи вимагає субпроект придбання приватних земель?		V	Відхилення СП	Впровадження СП	
26	Чи існує ймовірність того, що субпроект призведе до будь-яких незворотних пошкоджень або втрати житла, іншої власності, можливості використання ресурсів?		V	Відхилення СП	Впровадження СП	

27	Чи існує вірогідність виселення, закриття бізнесу, комерційної діяльності та діяльності із забезпечення засобів існування людей під час будівництва?		V	Відхилення СП	Впровадження СП	
28	Чи є тимчасове чи постійне фізичне переміщення людей у зв'язку з будівництвом?	V		ПЕСМ	Впровадження СП	На період проведення робіт навчання проводитиметься у інших приміщеннях ДПТНЗ
29	Чи передбачас субпроект переселення людей? Якщо так, надайте пояснення		V	Відхилення СП	Впровадження СП	
30	Чи втратить населення тимчасово або назавжди доступ до засобів виробництва, послуг, природних ресурсів?		V	Відхилення СП	Впровадження СП	
31	Чи відбудеться втрата/ пошкодження сільськогосподарських земель, незібраного врожаю, дерев?		V	Відхилення СП	Впровадження СП	
32	Чи призведе проект до втрати зайнятості, робочих місць?		V	Відхилення СП	Впровадження СП	
33	Чи проведення нових будівельних робіт потребує додаткової/ кваліфікованої робочої сили не з числа місцевих жителів?		V	ПЕСМ	Впровадження СП	
34	Чи субпроект/ будівельна діяльність спричинить порушення/ неспокій у житті місцевої громади?		V	ПЕСМ	Впровадження СП	
35	Чи будівництво нових будівель, дренажних систем, ліній електропередач заподіють якусь шкоду громадським будівлям/ ресурсам/ прилеглим будинкам, колодязям, землям, місцям поховань, дитячим паркам, школам тощо?		V	Відхилення СП	Впровадження СП	
36	Чи може субпроект спричинити такі непередбачувані наслідки як нещасні випадки?	V		ПЕСМ	Впровадження СП	
37	Чи є вразливі групи населення, які можуть зазнати негативного впливу (включаючи корінне населення) через заходи проекту?		V	Відхилення СП	Впровадження СП	

ПРОТОКОЛ
громадських консультацій щодо реалізації субпроєкту

1	Дата та час проведення	09.12.2021 о 15.00
2	Субпроєкт	Модернізація інфраструктури Вінницького міжрегіонального вищого професійного училища
3	Місце проведення, формат	Змішаний, зустріч в аудиторіях закладу та онлайн-підключення за допомогою платформи Zoom
4	Консультанти/ Модератори	<u>З боку ДНЗ:</u> Дмитрик Олександр Дмитрович, директор Корженко Світлана Гаврилівна, заступник директора з навчально-виховної роботи <u>З боку УФСІ:</u> Щербиніна Тетяна Юріївна, спеціаліст з моніторингу та оцінки, екологічних та соціальних питань, модератор Шулик Ярослав Іванович, керівник групи впровадження проєкту у Чернівецькій та Вінницькій областях Головченко Олександр Васильович, інженер з впровадження субпроєктів у Чернівецькій та Вінницькій областях
5	Учасники	92 особи, список додається
6	Порядок денний	1. Огляд мети громадських консультацій. 2. Огляд проєктованої діяльності: загальна інформація щодо Проєкту та Субпроєкту, перелік запланованих заходів з реконструкції та закупівлі обладнання. 3. Огляд та обговорення очікуваних екологічних та соціальних ризиків та впливів субпроєкту, описаних у проєкті Плану екологічного та соціального менеджменту (ПЕСМ), обговорення потенційних змін в освітньому процесі. 4. Огляд Плану взаємодії із зацікавленими сторонами, у тому числі Механізму розгляду скарг: мета розроблення, механізм подання та розгляду скарг, відповідальні особи з боку ДНЗ та УФСІ за реєстрацію і розгляд скарг. 5. Обговорення наданої інформації, відповіді на запитання.
7	Питання, підняті учасниками під час консультацій	Тетяна (мати учениці ДНЗ): щодо термінів завершення модернізації ДНЗ. Щербиніна Т.Ю. (УФСІ): запланований термін завершення заходів за субпроєктом – жовтень 2023 року.

Представник ДНЗ:
Директор

О.Д. Дмитрик

Представники УФСІ:
Керівник групи впровадження проєкту
у Чернівецькій та Вінницькій областях

Я.І. Шулик

Спеціаліст з моніторингу та оцінки,
екологічних та соціальних питань

Т.Ю. Щербиніна
